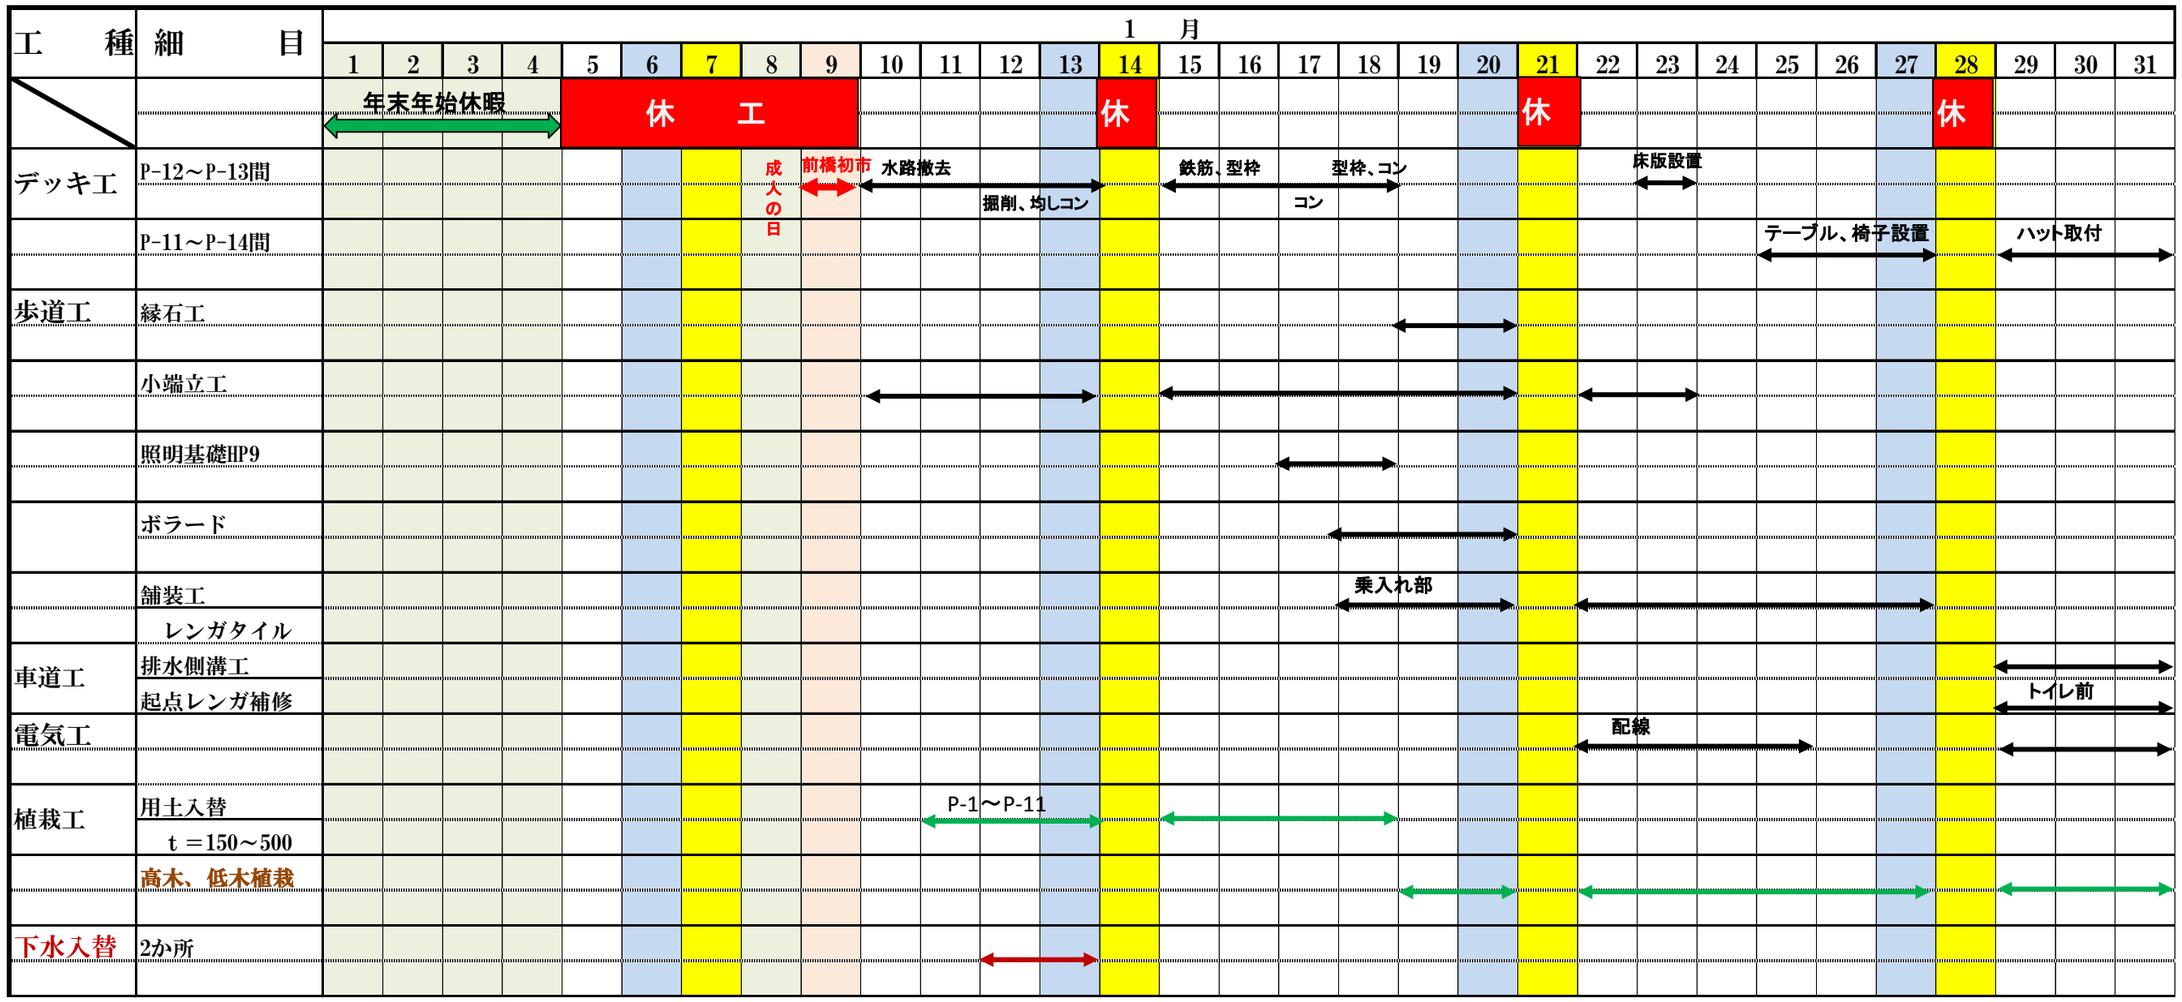
工　種
細　目
1　月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
年末年始休暇
休　工
休
休
休
デッキ工
P-12～P-13間
成人の日
前橋初市
水路撤去
掘削、均しコン
鉄筋、型枠
型枠、コン
コン
床版設置
P-11～P-14間
テーブル、椅子設置
ハット取付
歩道工
縁石工
小端立工
照明基礎HP9
ボラード
舗装工
乗入れ部
レンガタイル
車道工
排水側溝工
起点レンガ補修
トイレ前
電気工
配線
植栽工
用土入替
t ＝150～500
P-1～P-11
高木、低木植栽
下水入替
2か所
